

# 作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：6 月 16 日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

## 1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：80[%]
- マイルストーン達成状況：おおよそ達成（指揮デバイスの筐体実装が最終固定のみ）
- 主要成果：
  - 指揮デバイスの筐体（段ボール製）の制作がほぼ完成（No.2112）
  - 基盤に設置したスライド式可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置（No.2112）
- 重大課題（影響度：高）：
  - 特になし

## 2. 作業ログ（詳細トラッキング）

### 2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

| No.  | 作業項目          | 開始日  | 予定完了日 | 状態     | 進捗率  | 依存関係・ブロッカー | コメント                                                 |
|------|---------------|------|-------|--------|------|------------|------------------------------------------------------|
| 2112 | 本体・センサの実装     | 5/24 | 6/17  | 進行中    | 90%  | 無          | 段ボール筐体の制作がほぼ完成、基盤設置済の可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置、残りは最終固定のみ、 |
| 2113 | BPM・音量変化機構の実装 | 5/29 | 6/1   | おおよそ完了 | 95%  | 無          | 実装自体は完了、6/17の授業内でスライド式可変抵抗器の動作確認を行えば完了、              |
| -    | 作業ログの記入       | 6/10 | 6/16  | 完了     | 100% | 無          | 特になし、                                                |

### 2.2 日ごとの作業ログ

表 2: 日ごとの作業ログ

| 日付   | No.  | 作業項目      | 時間   | 開始時の状態 | 終了時の状態 | 進捗率  | コメント                                                             |
|------|------|-----------|------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------|
| 6/10 | 2112 | 本体・センサの実装 | 2h   | 進行中    | 進行中    | 75%  | 1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良が判明し、再はんだ付けの修正を班員に委任。基盤設置済の可変抵抗器を筐体へ仮配置。 |
| 6/11 | 2112 | 本体・センサの実装 | 1.5h | 進行中    | 進行中    | 80%  | 段ボール筐体のスライダー用開口部・ボタン穴の加工を実施。                                     |
| 6/12 | 2112 | 本体・センサの実装 | 2h   | 進行中    | 進行中    | 85%  | 基盤・可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体内部に固定し、配線を整理。                                |
| 6/14 | 2112 | 本体・センサの実装 | 1h   | 進行中    | 進行中    | 88%  | 筐体の外観を整え、各操作部が干渉なく動作することを確認。                                     |
| 6/15 | 2112 | 本体・センサの実装 | 0.5h | 進行中    | 進行中    | 90%  | 筐体の最終調整を実施し、ほぼ完成。残りは最終固定のみ。                                      |
| 6/16 | -    | 作業ログの記入   | 1h   | 未着手    | 完了     | 100% | 特になし。                                                            |

### 3. 計画時の GC と現在の GC

計画段階のガントチャート (GC) を図 1 (実装フェーズ) および図 2 (テストフェーズ) に示す。

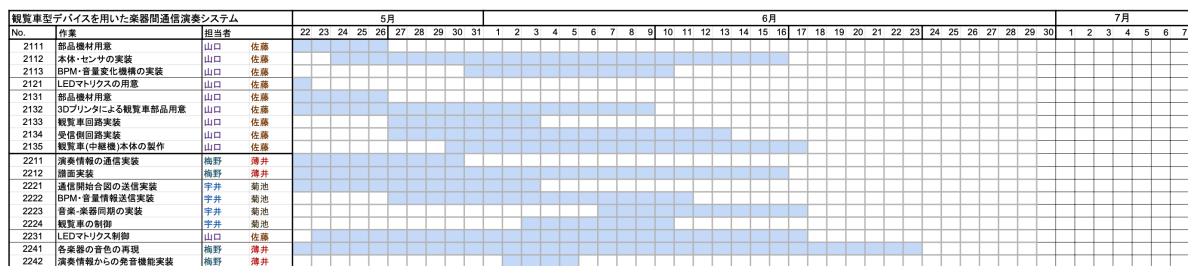


図1 計画段階のガントチャート（実装フェーズ）




図2 計画段階のガントチャート（テストフェーズ）

次に、現在の GC を図 3 に示す。達成した項目は緑色で塗られている。

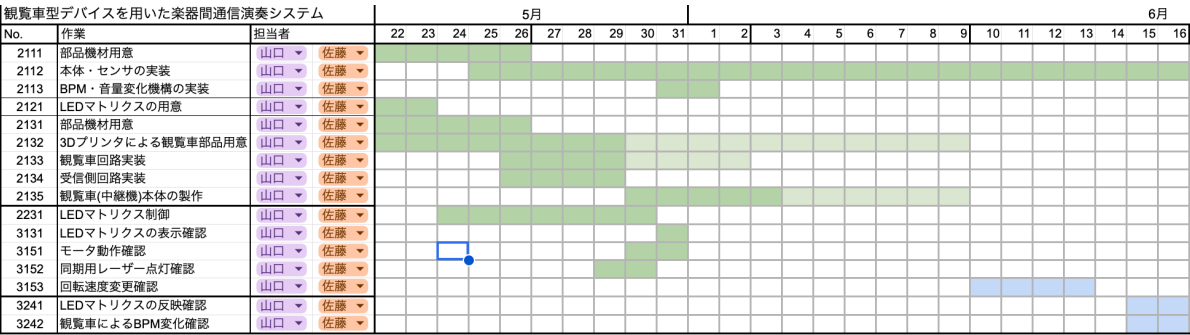


図 3 現在のガントチャート

4. 課題管理

| 課題                                       | 発生原因                             | 影響度 | 優先度 | 対策                          | 期限   | 状態  |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----------------------------|------|-----|
| 可変抵抗器がブレッドボード上で安定接続できない(No.2112/2113に影響) | スライド式可変抵抗器の端子形状がブレッドボードに適合しないため、 | 高   | 高   | スライド式可変抵抗器を基盤に設置し、筐体へ固定した。  | 6/12 | 対応済 |
| 1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良 (No.2112 に影響)   | 基盤へのはんだ付け時に接触不良が発生したため、          | 中   | 高   | 再はんだ付けの修正を班員に委任中 (現在手元にない)。 | 6/17 | 対応中 |

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

今回は AI の利用なし。

6. 次回計画

- 目標：指揮デバイスの最終固定およびテストフェーズへの移行
  - 指揮デバイスの筐体を最終固定し、本体・センサの実装 (No.2112) を完了する。
  - テストフェーズに移行し、LED マトリクスの反映確認 (No.3241) を実施する (図 2 参照)。
- 達成基準：
  - 指揮デバイスの筐体が完成し、各操作部が正しく動作すること。
  - LED マトリクスの反映確認 (No.3241) に着手できていること。
- 期限：
  - 2026/6/23

## 7. 付録

- 添付資料：
    - No.2113(可変抵抗器から読み取った値を 5 段階にして出力するプログラム) のプログラム：[https://github.com/Sato907/3S\\_HCK1/tree/main/HCK1\\_group/HCK1\\_group\\_mywork/shiki\\_device](https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/shiki_device)
-
