

作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：6 月 16 日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：60[%]
- マイルストーン達成状況：一部未達（指揮デバイスの筐体実装が最終段階）
- 主要成果：
 - 指揮デバイスの筐体（段ボール製）の制作がほぼ完成（No.2112）
 - 基盤に設置したスライド式可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置（No.2112）
 - タクトスイッチの動作確認用プログラム（button_test）の作成・検証（No.2112）
- 重大課題（影響度：高）：
 - 指揮デバイスの筐体（No.2112）はほぼ完成したが、最終固定が残っている。また、1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良が 6/10 に判明し、再はんだ付けの修正が必要であった。

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
2112	本体・センサの実装	5/24	6/16	進行中	90%	無	段ボール筐体の制作がほぼ完成。基盤設置済の可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置。残りは最終固定のみ。
2113	BPM・音量変化機構の実装	5/29	6/16	進行中	85%	通信部の結合待ち	可変抵抗器から読み取った値を 5 段階にして出力する処理は実装・検証済。残りは UDP 送信（通信部）の結合。
-	作業ログの記入	6/10	6/16	完了	100%	無	特になし。

2.2 日ごとの作業ログ

表 2: 日ごとの作業ログ

日付	No.	作業項目	時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	コメント
6/10	2112	本体・センサの実装	2h	進行中	進行中	75%	タクトスイッチの動作確認用プログラム（button_test）を作成し、押下検知を確認。1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良が判明し、再はんだ付けの修正を実施。基盤設置済の可変抵抗器を筐体へ仮配置。
6/11	2112	本体・センサの実装	1.5h	進行中	進行中	80%	段ボール筐体のスライダ用開口部・ボタン穴の加工を実施。
6/12	2112	本体・センサの実装	2h	進行中	進行中	85%	基盤・可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体内部に固定し、配線を整理。
6/13	2112	本体・センサの実装	1.5h	進行中	進行中	90%	筐体上部の蓋を加工し、スライダ・ボタンの操作面を成形。
6/14	2112	本体・センサの実装	1h	進行中	進行中	88%	筐体の外観を整え、各操作部が干渉なく動作することを確認。
6/15	2112	本体・センサの実装	1h	進行中	進行中	90%	筐体の最終調整を実施し、ほぼ完成。残りは最終固定のみ。
6/16	-	作業ログの記入	1h	未着手	完了	100%	特になし。

3. 計画時の GC と現在の GC

最終計画書に記載された計画段階のガントチャート (GC) を図 1 に示す。

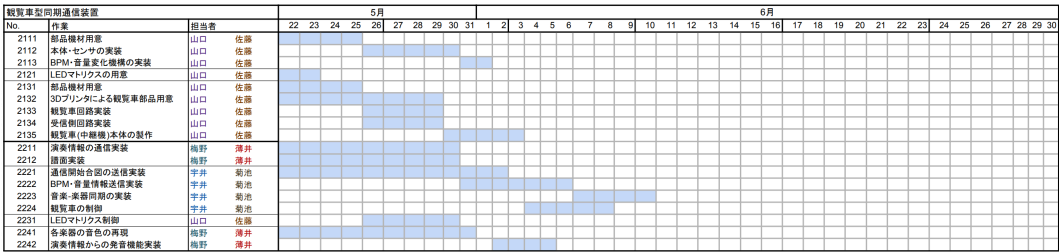


図 1 計画段階のガントチャート

次に、現在の GC を図 2（実装フェーズ）および図 3（テストフェーズ）に示す。達成した項目は緑色で塗られている。

5.2 検証方法

- 検証手法：
 - AI が生成したタクトスイッチ動作確認プログラムを Arduino IDE 上でコンパイル・実行し、押下に応じてシリアルモニタの出力が変化するか確認した。
 - AI の出力内容と Arduino 公式ドキュメントを比較し、使用関数や実装方法に誤りがないか確認した。
 - 参照資料：
 - Arduino 公式ドキュメント：<https://docs.arduino.cc/>
 - Arduino Tutorials：<https://docs.arduino.cc/tutorials/>
 - 検証手順：
 1. AI へタクトスイッチの動作確認方法について質問した。
 2. AI が生成した内容をもとに検証用プログラムを作成した。
 3. Arduino へプログラムを書き込み、シリアルモニタおよび実機で動作を確認した。
 4. AI の出力内容を Arduino 公式ドキュメントと比較し、実装内容に誤りがないことを確認した。
-

5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - AI が提示したタクトスイッチの読み取り処理は、Arduino 公式ドキュメントの内容と一致していた。
 - 不一致・疑義：
 - 一部のサンプルコードにおいて、プルアップ／プルダウンの設定が実際の配線と異なる場合があり、修正が必要であった。
 - 最終判断：
 - 一部採用
 - 根拠：
 - Arduino 公式ドキュメントとの比較により、AI の出力内容がおおむね正確であることを確認したため。
 - 実際に検証用プログラムを動作させ、正常に動作することを確認したため。
-

6. 次回計画

- 目標：指揮デバイスの完成（筐体の最終固定）、観覧車型中継機の製作着手
 - 指揮デバイスの筐体を最終固定し、本体・センサの実装を完了する。
 - 観覧車型中継機の部品用意および本体製作に着手する。
 - 達成基準：
 - 指揮デバイスの筐体が完成し、各操作部が正しく動作すること。
 - 観覧車型中継機の部品が用意され、製作に着手できていること。
 - 期限：
 - 2026/6/23
-

7. その他

- 指揮デバイスの筐体は，計画書および第六回で想定した 3D プリンタ製（Tinkercad 設計）から段ボール製に変更しており，今回その制作がほぼ完成した.
-

8. 付録

- 添付資料：
 - No.2112(タクトスイッチの動作確認) のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/button_test
 - No.2113(可変抵抗器から読み取った値を 5 段階にして出力するプログラム) のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/shiki_device
-
