

作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：6 月 16 日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：80[%]
- マイルストーン達成状況：おおよそ達成（指揮デバイスの筐体実装が最終段階）
- 主要成果：
 - 指揮デバイスの筐体（段ボール製）の制作がほぼ完成（No.2112）
 - 基盤に設置したスライド式可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置（No.2112）
 - 通信部との結合を確認（No.2113）
- 重大課題（影響度：高）：
 - 指揮デバイスの筐体（No.2112）はほぼ完成したが、最終固定が残っている。また、1 個のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良が 6/10 に判明し、再はんだ付けの修正を班員に委任中。

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
2112	本体・センサの実装	5/24	6/16	進行中	90%	無	段ボール筐体の制作がほぼ完成。基盤設置済の可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置。残りは最終固定のみ。
2113	BPM・音量変化機構の実装	5/29	6/16	進行中	95%	音量の実装が未完	6/10 の授業にて通信部との結合を確認。音量が未実装のため残課題あり。
-	作業ログの記入	6/10	6/16	完了	100%	無	特になし。

2.2 日ごとの作業ログ

表 2: 日ごとの作業ログ

日付	No.	作業項目	時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	コメント
6/10	2112	本体・センサの実装	2h	進行中	進行中	75%	1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良が判明し、再はんだ付けの修正を班員に委任。基盤設置済の可変抵抗器を筐体へ仮配置。
6/11	2112	本体・センサの実装	1.5h	進行中	進行中	80%	段ボール筐体のスライダー用開口部・ボタン穴の加工を実施。
6/12	2112	本体・センサの実装	2h	進行中	進行中	85%	基盤・可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体内部に固定し、配線を整理。
6/13	2112	本体・センサの実装	1.5h	進行中	進行中	90%	筐体上部の蓋を加工し、スライダー・ボタンの操作面を成形。
6/14	2112	本体・センサの実装	1h	進行中	進行中	88%	筐体の外観を整え、各操作部が干渉なく動作することを確認。
6/15	2112	本体・センサの実装	0.5h	進行中	進行中	90%	筐体の最終調整を実施し、ほぼ完成。残りは最終固定のみ。
6/16	-	作業ログの記入	1h	未着手	完了	100%	特になし。

3. 計画時の GC と現在の GC

最終計画書に記載された計画段階のガントチャート (GC) を図 1 に示す。

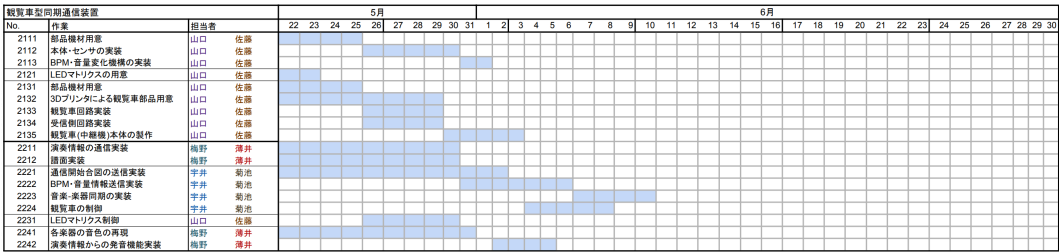


図 1 計画段階のガントチャート

次に、現在の GC を図 2（実装フェーズ）および図 3（テストフェーズ）に示す。達成した項目は緑色で塗られている。

観覧車型デバイスを用了た楽器間通信演奏システム			5月										6月																7月																					
No.	作業	担当者	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	
2111	部品機材用意	山口 佐藤																																																
2112	本体・センサの実装	山口 佐藤																																																
2113	BPM・音量変化機構の実装	山口 佐藤																																																
2121	LEDマトリクスを用意	山口 佐藤																																																
2131	部品機材用意	山口 佐藤																																																
2132	3Dプリンタによる観覧車部品用意	山口 佐藤																																																
2133	観覧車回路実装	山口 佐藤																																																
2134	受信側回路実装	山口 佐藤																																																
2135	観覧車(中継機)本体の製作	山口 佐藤																																																
2211	演奏情報の通信実装	梅野 薄井																																																
2212	譜面実装	梅野 薄井																																																
2221	通信開始合図の送信実装	宇井 菊池																																																
2222	BPM・音量情報送信実装	宇井 菊池																																																
2223	音楽・楽器同期の実装	宇井 菊池																																																
2224	観覧車の制御	宇井 菊池																																																
2231	LEDマトリクス制御	山口 佐藤																																																
2241	各楽器の音色の再現	梅野 薄井																																																
2242	演奏情報からの発音機能実装	梅野 薄井																																																

図 2 現在のガントチャート（実装フェーズ）

No.	作業	担当者	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	
3111	各音色の再現確認	梅野 薄井																																																
3112	発音機能の確認	梅野 薄井																																																
3121	演奏開始時の合図送信確認	宇井 菊池																																																
3122	BPM・音量の変化確認	宇井 菊池																																																
3131	LEDマトリクスの表示確認	山口 佐藤																																																
3141	レーザー受信確認	宇井 菊池																																																
3142	演奏情報の送信確認	梅野 薄井																																																
3151	モータ動作確認	山口 佐藤																																																
3152	同期用レーザー点灯確認	山口 佐藤																																																
3153	回転速度変更確認	山口 佐藤																																																
3211	開始音等の受信確認	宇井 菊池																																																
3212	BPM・音量変化の反映確認	宇井 菊池																																																
3221	各楽器の発音確認	梅野 薄井																																																
3231	BPM・音量変化の発音確認	梅野 薄井																																																
3241	LEDマトリクスの反映確認	山口 佐藤																																																
3242	観覧車によるBPM変化確認	山口 佐藤																																																

図 3 現在のガントチャート（テストフェーズ）

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
可変抵抗器がブレッドボード上で安定接続できない(No.2112/2113に影響)	スライド式可変抵抗器の端子形状がブレッドボードに適合しないため、	高	高	スライド式可変抵抗器を基盤に設置し、筐体へ固定した、	6/12	対応済
1 機のスライド式可変抵抗器のはんだ付け設置不良 (No.2112 に影響)	基盤へのはんだ付け時に接触不良が発生したため、	中	高	再はんだ付けの修正を班員に委任中（現在手元にない）、	6/17	対応中

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

今回は AI の利用なし、

6. 次回計画

- 目標：指揮デバイスの最終固定およびテストフェーズへの移行
 - 指揮デバイスの筐体を最終固定し、本体・センサの実装 (No.2112) を完了する、
 - テストフェーズに移行し、LED マトリクスの反映確認 (No.3241) を実施する（図 3 参照）。
- 達成基準：

- 指揮デバイスの筐体が完成し、各操作部が正しく動作すること.
 - LED マトリックスの反映確認 (No.3241) に着手できていること.
 - 期限：
 - 2026/6/23
-

7. その他

- 指揮デバイスの筐体は、計画書および第六回で想定した 3D プリンタ製 (Tinkercad 設計) から段ボール製に変更しており、今回その制作がほぼ完成した.
-

8. 付録

- 添付資料：
 - No.2113(可変抵抗器から読み取った値を 5 段階にして出力するプログラム) のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/shiki_device
-
