

作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：7月1日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：95[%]
- マイルストーン達成状況：テストフェーズの結合テストを実施
- 主要成果：
 - 結合テスト（No.3121, 3141, 3211, 3212）を実施
 - 計画書との変更履歴および計画書の訂正を完了
 - LED マトリクスの反映確認（No.3241）を完了
- 重大課題（影響度：高）：
 - 特になし

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
3121	演奏開始の合図送信確認	6/10	6/17	進行中	80%	無	グループで集まり実施.
3141	レーザー受信確認	6/17	7/1	進行中	80%	無	グループで集まり実施.
3211	開始信号の受信確認	6/10	6/17	進行中	80%	無	グループで集まり実施.
3212	BPM・音量変化の反映確認	6/10	7/1	進行中	80%	無	グループで集まり実施.
3241	LED マトリクスの反映確認	6/17	7/1	完了	100%	無	結合テストにて確認完了.
-	計画書の変更履歴・訂正	6/25	6/25	完了	100%	無	変更履歴と計画書の訂正を実施.

次ページへ続く

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
-	作業ログの記入	6/30	6/30	完了	100%	無	特になし.

2.2 日ごとの作業ログ

今週は 6/25,6/30 の放課後にてグループで集まり、結合テストを実施したことが主な作業として挙げられる。なお、ガントチャートに結合テストに該当する作業項目が存在しないため、今回は代替として No.3121, No.3141, No.3211, No.3212 に加算している。また、この 2 日間の作業時間は、各作業項目の時間を明記することが困難であったため、グループで結合テストを実施した合計稼働時間とした。したがって、今週の合計作業時間は 16h である。

表 2: 日ごとの作業ログ

日付	No.	作業項目	時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	コメント
6/24	3141	LEDMatrix の反映確認	1.5h	未着手	完了	100%	授業内にて確認完了.
6/25	3121	演奏開始の合図送信確認	6h	進行中	進行中	80%	グループで集まり通信班の手伝いとして実施.
6/25	3141	レーザー受信確認	6h	進行中	進行中	80%	グループで集まり通信班の手伝いとして実施.
6/25	3211	開始信号の受信確認	6h	進行中	進行中	80%	グループで集まり通信班の手伝いとして実施.
6/25	3212	BPM・音量変化の反映確認	6h	進行中	進行中	80%	グループで集まり通信班の手伝いとして実施.
6/25	-	計画書の変更履歴・訂正	3h	未着手	完了	100%	計画書との変更履歴と計画書の訂正を実施.
6/30	3121	演奏開始の合図送信確認	3.5h	進行中	進行中	80%	グループで集まり通信班の手伝いとして実施.
6/30	3141	レーザー受信確認	3.5h	進行中	進行中	80%	グループで集まり通信班の手伝いとして実施.
6/30	3211	開始信号の受信確認	3.5h	進行中	進行中	80%	グループで集まり通信班の手伝いとして実施.
6/30	3212	BPM・音量変化の反映確認	3.5h	進行中	進行中	80%	グループで集まり通信班の手伝いとして実施.
6/30	-	作業ログの記入	2h	未着手	完了	100%	特になし.

3. 計画時の GC と現在の GC

計画段階のガントチャート (GC) を図 1 (実装フェーズ) および図 2 (テストフェーズ) に示す。

次に、現在の GC を図 3 に示す。達成した項目は緑色で塗られている。

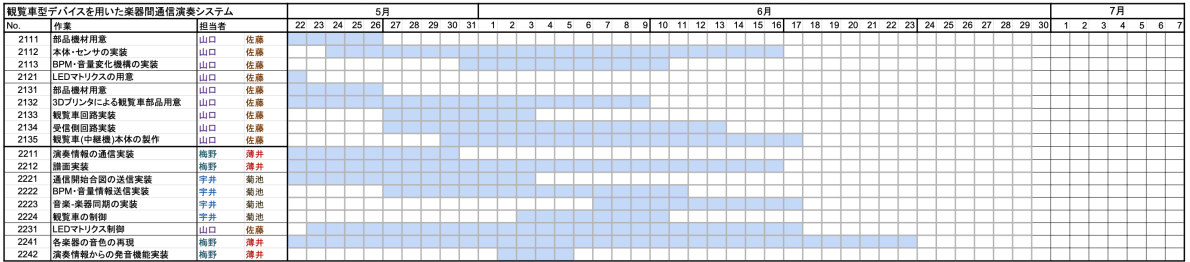


図 1 計画段階のガントチャート（実装フェーズ）




図 2 計画段階のガントチャート（テストフェーズ）




図 3 現在のガントチャート

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
テストフェーズが結合待ち (No.3241 に影響)	通信系との結合が完了していないため、LED マトリクスの反映確認テストが実施できない。	高	中	6/25 にグループで集まり結合テストを実施し、確認完了。	6/30	対応済

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

今回は AI を利用していない。

6. 次回計画

- 目標：最終発表に向けた準備

- 残りのテスト項目の確認と最終調整を行う。
 - 発表資料の作成に着手する。
 - 達成基準：
 - 全テスト項目が完了し、システム全体が正常に動作すること。
 - 期限：
 - 2026/7/7
-
